

昌吉回族自治州奇台县 2022 年度 预算绩效评价报告

项目名称：东湾镇墙户村自来水管网改造项目

项目单位：奇台县水利工程建设管理处

主管部门：奇台县农业农村局（乡村振兴局）

委托单位：奇台县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息科技有限公司

2022 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	东湾镇墙户村自来水管网改造项目				评价年度	2022
财政局分管 科室	奇台县农业科		联系人及联系方式		苟维璐 18109941369	
项目主管部门	奇台县农业农村局（乡村振兴局）		联系人及联系方式		卢旭东 18199297365	
项目实施单位	奇台县水利工程建设管理处		联系人及联系方式		唐小亮 13639955217	
资金来源	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
项目资金 投入总额	500 万元	项目资金执行数		500 万元	资金执行率	100%
发放调查 问卷	69	回收有效问卷	69	满意度情况	90.03%	
采用的评价方 法与评价标准	评价方法：文献法、对分析比法、公众批判法等方法 评价标准：通用标准、计划标准、预算支出标准					
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 92.9 分，评价等级为“优”。					
项目主评人 （签字）						



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

为更好地推进郊区集约化供水、改善农村饮水质量，提高供水效率，奇台县水利工程建设管理处根据《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金》（新乡村振兴〔2021〕32号）《关于实施奇台县提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》（奇乡村振兴办〔2021〕1号）《关于成立奇台县2022年东湾镇埒户村自来水管网改造项目项目部通知》（奇水建管〔2022〕1号）文件相关请示进行开展自来水供水管网的改建。东湾镇埒户村自来水管网改造项目安排预算500万元，资金500万元为中央乡村振兴衔接资金。主要用于奇台县东湾镇埒户村自来水管网改造，对影响水质达标、陈旧老化的管网进行改造、对于已经老化部分的管道采取直接更换新，使管网漏损得到有效控制，保障水质达标及居民和牲畜的用水安全，基本实现城乡供水公共服务均衡化。

（二）项目实施情况

1.项目内容

奇台县东湾镇埒户村自来水管网改造项目主要是奇台县东湾镇埒户村改造管网 32.89km，预制钢筋混凝土闸阀井 98 座及配套工程，消毒设施一套，管网信息化自动化建设，改建埒户村输配水管网，改善项目区 3279 人，牲畜 18840 头（只）饮水条件，改善其生活条件和生活环境，为其脱贫



致富创造有利条件。

2.项目规模及范围

奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目资金主要用于奇台县东湾镇墙户村自来水管道的更换、改造及配套设施的完善,涉及的单位有奇台县财政局、奇台县农业农村局(乡村振兴局)、奇台县水利建设管理处和各中标单位,通过此项目的实施从而来改善其生活条件和生活环境,为其脱贫致富创造有利条件。并且对奇台县东湾镇墙户村水管网的长度及阀井数量、项目的开工时间、项目的完工时间、受益脱贫户、满意度进行评价。

(三) 绩效目标

1.总目标

对奇台县东湾镇墙户村自来水管道路老化、破损、导致水压不稳、水管跑冒滴漏等问题的发生,进行自来水水管网改造,完成奇台县东湾镇墙户村 32.89km 水管网的改造,安装预制钢筋混凝土闸阀井 98 座及配套工程,消毒设备一套,管网信息化自动化建设,保证缺水地块的供水及水的流动性,进一步保障东湾镇墙户村人畜饮水安全,以达到改善供水水质、提高供水压力,改善村民生活用水质量、确保管网安全运行。

2.年度绩效目标

本项目 2022 年度绩效目标见下表 1-2:



表1-2 奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目绩效目标表

二级指标	三级指标	预期指标值
数量指标	自来水管网改造长度	≥32.89km
	吊装钢筋混凝土预制井	≥98 座
质量指标	工程验收合格率	=100%
时效指标	开工时间	2022 年 4 月
	竣工时间	2022 年 6 月
成本指标	设备采购	≤199.4 万元
	土建及安装	282.75 万元
	项目工程建设其他费用	≤17.85 万元
社会效益指标	受益群众户数	≥920 户
	受益人数	≥3279 人
	受益脱贫户	≥8 户
	保障东湾镇墙户村村民饮水安全	≥95%
可持续影响指标	工程使用年限	≥30 年
满意度指标	受益群众满意度	≥95%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 92.9 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评



分过程详见附件 1。

（二）预算执行情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数为500万元，全年预算数为500万元，资金为中央乡村振兴衔接资金。

2.资金使用情况

截至2022年12月31日，该项目全年执行数为500万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效情况

东湾镇墙户村自来水管网改造项目按照补文件要求，奇台县水利工程建设管理处进行项目的相关改造工作，项目资金执行率 100%。此项目完成对全长 32.2km 水管网改造，安装预制钢筋混凝土闸阀井 46 座及配套工程，项目于 2022 年 4 月 1 日开工，2022 年 6 月 30 日竣工。通过项目的实施有效改善了供水水质、提高了供水压力，村民生活用水质量得到改善、保障了管网安全运行。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.参建单位职责分明，保障项目顺利推进

自来水管网改造工程施工难度大，需要全面掌握老管网的走向及位置，才能保障项目的顺利完成，为此，项目单位加强事前控制，统筹协调各参建单位分工合作，推进项目建设，确保了此项目工程的顺利推进。

2.施工方案合理、降低对居民影响。



工程建设期间，建设单位以此保障居民的用水安全为前提，为减少因施工导致停水情况，采取多方联动方式尽量减少停水频率，并合理的提醒了用水户合理安排好生活用水，缩小对周边村民的生活影响。

（二）存在问题与不足

1.绩效目标不够完整，预算管理有待加强。

绩效目标不够完整，此项目年度绩效目标可实现、可衡量、与总目标相关，有时间限制。但是目标完整性需要有待提高，因为此项目的成本里包含设备采购，数量、质量、时效指标里缺少采购设备的相关指标，指标不完整，预算管理有待加强，对于目标值的填报不是很准确，标杆值与实际完成值偏差大。

2.受益群众满意度有待提升

满意度低于目标值 95%，满意度水平有待提高。根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 90.03%，调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对自来水管网改造项目实施的评价（92.75%）、您对自来水管网改造项目宣传力度评价（90.72%）、您对目前的供水服务的评价（88.12%）、您对饮水水质的评价（89.57%）、村民饮水安全保障情况的评价（88.99%）。

3.对村民饮水安全及供水服务保障度不够

通过满意度调查问卷及调研发现村民对供水服务的评价为 88.12%、对村民饮水安全保障情况的评价为 88.99%，



可以看出对供水服务及村民饮水安全的保障评价需要有待提高。

4.宣传政策的力度需加强、宣传渠道少。

根据调查和满意度问卷看出在 69 份有效问卷中，被调查对象中选工程宣传牌或项目公示的比例为 37.68%，选看到工程建设队伍的比例为 50.72%，选其他的比例为 11.59%。可以看出宣传政策的力度还需要加强，宣传的渠道单一、没有多渠道的进行宣传，让更多的人了解自来水管网改造项目。

（三）建议和改进措施

1.加强目标完整性、加强预算管理

加强绩效目标的合理性，建议增加指标数量指标“设置设备数”质量指标“设备验收合格率”经济效益指标“设备利用率”，使目标更完整，进一步提升预算绩效管理水平。对于目标的填报要进行合理预估，缩小实际值与标杆值的偏差，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从完整性、明确性、合理性、可实现性、相关性、时限性等方面着手，设置与项目匹配的核心指标，每条指标设置都具有相关性，更好地凸显项目绩效。加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关。

2.提升受益群众满意度、提高群众幸福感

首先，加强与村民之间的沟通，建议通过多种方式收集村民的对自来水管网改造项目的意见和建议，其次，要进行定期对管道设施进行查看，出现问题及时解决，以此来提升



村民的满意度，也使项目的实施发挥更大的作用，从而提升群众的幸福感。

3.提升村民用水安全，有效保障供水服务

首先应对设备定期进行巡检维护，并对水质进行定期和不定期的抽检，查看水质是否符合标准。其次加强管理监督措施，并提升服务管理功能，从而保障供水的服务和村民用水安全。

4.加大宣传力度，提高自来水管网改造项目认知度。

首先，加强对自来水管网改造项目宣传，通过多渠道方式进行宣传自来水管网改造项目，提高普及率，其次，拓宽宣传渠道，不止在张贴宣传标识，可以通过村广播、政府网站、抖音等多种方式进行宣传。让村民了解自来水管网改造项目的具体实施政策，从而提高村民对自来水管网改造项目的认知度。



目 录

摘 要.....	1
一、项目概况.....	1
（一）项目背景.....	1
（二）项目内容及规模.....	1
（三）资金来源及使用情况.....	2
（五）项目绩效目标.....	5
二、评价工作概述.....	6
（一）评价目的与原则.....	6
（二）评价方法.....	6
（三）绩效评价指标体系.....	7
（四）评价组织实施.....	8
三、评价结论.....	10
四、绩效评价分析.....	12
（一）项目决策情况.....	12
（二）项目过程情况.....	14
（三）项目产出情况.....	15
（四）项目效益情况.....	16
五、主要经验及存在问题.....	18
（一）主要经验及做法.....	18



（二）存在问题.....	18
六、相关建议.....	19
七、其他需要说明的问题.....	20
八、绩效评价结果应用建议.....	21
（一）及时对评价中发现的问题进行整改.....	21
（二）评价结果公开.....	21
附件 1 综合评分表.....	22
附件 2 基础表.....	31
附件 3 工作量明细表.....	32
附件 4 问卷调查报告.....	33
附件 5 受益群众满意度问卷.....	41
附件 6 相关负责人访谈.....	43
附件 7 资料照片.....	45



东湾镇埒户村自来水管网改造项目预算绩效评价报告

受奇台县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于2023年7月5日至2023年7月25日对奇台县水利工程建设管理处负责管理实施的东湾镇埒户村自来水管网改造项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为更好地推进郊区集约化供水、改善农村饮水质量，提高供水效率，奇台县水利工程建设管理处根据《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金》（新乡村振兴〔2021〕32号）《关于实施奇台县提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》（奇乡村振兴办〔2021〕1号）《关于成立奇台县2022年东湾镇埒户村自来水管网改造项目项目部通知》（奇水建管〔2022〕1号）文件相关请示进行开展自来水供水管网的改建。东湾镇埒户村自来水管网改造项目安排预算500万元，资金500万元为中央乡村振兴衔接资金。主要用于奇台县东湾镇埒户村自来水管网改造，对影响水质达标、陈旧老化的管网进行改造、对于已经老化部分的管道采取直接更换新，使管网漏损得到有效控制，保障水质达标及居民和牲畜的用水安全，基本实现城乡供水公共服务均衡化。

（二）项目内容及规模



1. 项目内容

奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目主要是奇台县东湾镇墙户村改造管网 32.89km，预制钢筋混凝土闸阀井 98 座及配套工程，消毒设施一套，管网信息化自动化建设，改建墙户村输配水管网，改善项目区 3279 人，牲畜 18840 头（只）饮水条件，改善其生活条件和生活环境，为其脱贫致富创造有利条件。

2. 项目规模及范围

奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目资金主要用于奇台县东湾镇墙户村自来水管道的更换、改造及配套设施的完善，涉及的单位有奇台县财政局、奇台县农业农村局（乡村振兴局）、奇台县水利建设管理处和各中标单位，通过此项目的实施从而来改善其生活条件和生活环境，为其脱贫致富创造有利条件。并且对奇台县东湾镇墙户村水管网的长度及阀井数量、项目的开工时间、项目的完工时间、受益脱贫户、满意度进行评价。

3. 评价时段

本项目资金的评价时段为2022年1月1日—2022年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

1. 资金分配情况

该项目年初预算数为500万元，全年预算数为500万元，全部为中央乡村振兴衔接资金。

2. 资金使用情况



截至2022年12月31日，该项目全年执行数为500万元，预算执行率为100%。

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况：

本项目涉及奇台县财政局、奇台县农业农村局（乡村振兴局）、奇台县水利工程建设管理处、新疆绿赛节水科技开发有限公司、新疆三友工程建设有限公司、新疆淼盛源项目管理有限公司、新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司、新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司、昌吉州同洲工程试验检测有限责任公司。

奇台县财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同部门制定和完善专项补助资金管理办法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

奇台县农业农村局（乡村振兴局）：由奇台县农业农村局（乡村振兴局）相关部门组织指导奇台县水利工程建设管理处制定年度经费预算，并督促奇台县水利工程建设管理处按照年初预算开展东湾塆户自来水管改造活动以及资金使用情况。

奇台县水利工程建设管理处：组织编制专项资金绩效目标和年度预算，制定专项资金政策，发布政策通知，组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金决算和总结等工作。



新疆绿赛节水科技开发有限公司：此项目施工环节的管材单位，负责 PE 管材的提供，管材必须满足人饮水卫生标准。

新疆三友工程建设有限公司：此项目的施工单位，负责改造管网 32.89km（管径 DN50-DN400），压力等级 1.0Mpa-1.6Mpa，预制钢筋混凝土闸阀井 98 座及配套工程，消毒设备一套，管网信息化自动化建设，保证工程质量合格情况。

新疆淼盛源项目管理有限公司：东湾镇埒户村自来水管网改造项目的监理单位，签订监理合同后，各标段按合同要求分别组建项目监理部，总监、各标段监理人员进驻工地现场，监理人员全部持证上岗，在施工安全、质量、进度控制以及工程造价结算等方面履行监理职责，监理工作正常开展。

新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司：东湾镇埒户村自来水管网改造项目的建设单位，根据工程进度需求相应的设计代表常到工地，及时提供施工现场设计服务，完成设计交底、设计优化、现场设计问题处理等工作。

新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司：此项目的咨询单位负责对项目全过程跟踪、出具结（决）算审计报告。

昌吉州同洲工程试验检测有限责任公司：东湾镇埒户村自来水管网改造项目的施工质量检测单位，负责东湾镇埒户村自来水管网改造项目的施工质量检测。

2. 资金管理情况



根据《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金》（新乡振〔2021〕32号）《奇台县水利工程建设管理处项目资金财务管理制度》要求，在项目执行过程中项目实行专人管理，项目资金专人核算，保证资金专款专用，严格按照项目预算执行。根据项目计划和项目执行进度项目负责人申请使用资金，严格按照财务管理制度履行审批，自觉接受工作小组监督检查，确保项目资金使用安全有效，执行期间无违规执行项目资金情况发生。

（五）项目绩效目标

1. 总目标

对奇台县东湾镇墙户村自来水管网老化、破损、导致水压不稳、水管跑冒滴漏等问题的发生，进行自来水水管网改造，完成奇台县东湾镇墙户村 32.89km 水管网的改造，安装预制钢筋混凝土闸阀井 98 座及配套工程，消毒设备一套，管网信息化自动化建设，保证缺水地块的供水及水的流动性，进一步保障东湾镇墙户村人畜饮水安全，以达到改善供水水质、提高供水压力，改善村民生活用水质量、确保管网安全运行。

2. 年度绩效目标

本项目 2022 年度绩效目标见下表 1-1:

表1-1 奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目绩效目标表

二级指标	三级指标	预期指标值
数量指标	自来水管网改造长度	≥32.89km
	吊装钢筋混凝土预制井	≥98 座



二级指标	三级指标	预期指标值
质量指标	工程验收合格率	=100%
时效指标	开工时间	2022 年 4 月
	竣工时间	2022 年 6 月
成本指标	设备采购	≤199.4 万元
	土建及安装	282.75 万元
	项目工程建设其他费用	≤17.85 万元
社会效益指标	受益群众户数	≥920 户
	受益人数	≥3279 人
	受益脱贫户	≥8 户
	保障东湾镇墙户村村民饮水安全	≥95%
可持续影响指标	工程使用年限	≥30 年
满意度指标	受益群众满意度	≥95%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、对比分析法、公众批判法等



方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索和梳理奇台县水利工程建设管理处上交的关于奇台县东湾镇埝户村自来水管网改造项目相关的政策文件、招标、凭证文件等相关材料，了解立项依据的充分性及立项规范性。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。奇台县东湾镇埝户村自来水管网改造项目资金政策绩效评价过程中，评价组将奇台县水利工程建设管理处上报的各指标的实际完成值与年初填报的绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况、实现程度和效果。

公众批判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法，搜集标准统计数据的有效途径。我单位将采用线下访谈、实地调研和对 69 名受益群众进行问卷调查等方法对本次评价项目的项目人员和受益人员进行满意度调查，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到



效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

(1) 权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

(2) 评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

(四) 评价组织实施

1. 评价人员



本次评价委托方为奇台县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次奇台县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	史小娟	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	乔永胜	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	侯丹丹	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	杜婷	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	马宵莹	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	罗建	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 25 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2023 年 7 月 6 日前

受奇台县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与奇台县水利建设管理处沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。



（2）评价实施阶段——2023 年 7 月 9 日前

数据采集（2023 年 7 月 5 日前）。将基础表发送至奇台县水利工程建设管理处按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2023 年 7 月 13 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2023 年 7 月 18 日前

撰写评价报告（2023 年 7 月 15 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交奇台县水利工程建设管理处征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2023 年 7 月 25 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交奇台县财政局，并根据奇台县财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 92.9 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。



表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	15	14.2	94.67%
项目过程	20	20	100%
项目产出	50	46.45	92.9%
项目效益	15	12.25	81.67%
合计	100	92.9	92.9%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (15)	A1 项目立项 (5 分)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	2	规范	规范	2	100%
	A2 绩效目标 (5 分)	A201 绩效目标合理性	2	合理	基本合理	1.2	60%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (5 分)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (10 分)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100%
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%
	B2 组织实施 (10 分)	B201 管理制度健全性	5	健全	健全	5	100%
		B202 制度执行有效性	5	执行且有效	执行且有效	5	100%
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (20 分)	C101 自来水管网改造长度	10	≥32.89km	32.30km	9.1	91%
		C102 吊装钢筋混凝土预制井数量	10	≥98 座	46 座	7.35	73.47%
	C2 产出质量 (10 分)	C201 工程验收合格率	10	=100%	100%	10	100%
	C3 产出时效 (10 分)	C301 项目开工时间	10	=2022 年 4 月	2022 年 4 月 1 日	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C302 项目完工时间	10	2022 年 6 月	2022 年 6 月 30 日	10	100%
D 项目效益 (15)	D1 实施效益 (10 分)	D101 受益脱贫户	5	≥8 户	8 户	5	100%
		D102 保障东湾镇墙户村村民饮水安全率	5	≥95%	88.98%	3.5	70%
	D2 满意度 (5 分)	D201 受益群众满意度	5	≥95%	90.03%	3.75	75%
总分			100			92.9	92.9%

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 14.2 分，得分率 94.67%，具体分析如下：

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性：

《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金》（新乡村振兴〔2021〕32 号）《关于实施奇台县提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》（奇乡村振兴办〔2021〕1 号）《关于成立奇台县 2022 年东湾镇墙户村自来水管网改造项目项目部通知》（奇水建管〔2022〕1 号）相关文件进行设立；② 本项目与工作计划相匹配；③ 本项目与奇台县水利工程建设管理处单位职责密切相关。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 立项程序规范性：

① 项目根据《关于实施奇台县提前下达 2022 年中央财



政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》（奇乡振领办〔2021〕1号）《关于成立奇台县 2022 年东湾镇墙户村自来水管网改造项目项目部通知》（奇水建管〔2022〕1号）《东湾镇墙户村自来水管网改造项目实施技术方案技术审查意见》（奇水技审字〔2021〕1号）申请设立；②项目所提交的文件、材料符合相关文件要求，③此项目经过绩效评估及集体决策。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性：

①本项目设立了总目标和年度目标，先得 20%权重分；②年度绩效目标可实现、可衡量、与总目标相关，有时间限制。但是目标完整性需要有待提高，此项目的成本里包含设备采购，数量、质量、时效指标里缺少采购设备的相关指标，总指标不完整。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 1.2 分，得分率 60%。

（2）绩效指标明确性：

①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分值。②指标清晰、可衡量性。③项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性：

预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充



分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性：

①预算资金分配依据充分，有相应明细表；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上两项各得50%的权重分，综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1. 资金管理

(1) 资金到位率：

此项资金到位 500 万元，到位率为 100%。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率：

该项目预算金额为 500 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 500 万元，预算执行为 $500/500 \times 100\% = 100\%$ 。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(3) 资金使用合规性：

①本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；②预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；③项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率



100%。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性：

①制定《奇台县水利工程建设管理处项目资金财务管理制度》；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性：

①项目按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金》（新乡振〔2021〕32 号）《奇台县水利工程建设管理处项目资金财务管理制度》相关法律法规和相关管理规定；②因为此项目没有项目调整及支出调整故项目调整及支出调整手续不涉及。③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 50 分，绩效评价得分 46.45 分，得分率 92.9%，具体分析如下：

1. 产出数量

（1）自来水管网改造长度：

根据所收集资料，从项目验收竣工表中得出东湾镇埝户村自来水管网改造长度 32.30km，根据评分标准扣除 0.9 分，综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 9.1 分，得分率 91%。



(2) 吊装钢筋混凝土预制井数量

根据所收集资料，从项目验收竣工表中得出东湾镇墙户村吊装钢筋混凝土预制井数量为 46 座，根据评分标准扣除 2.65 分，综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 7.35 分，得分率 73.47%。

2. 产出质量

(1) 工程验收合格率：

根据所收集资料，从项目验收竣工表中得出工程验收合格率达到 100%，综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

3. 产出时效

(1) 项目开工时间：

根据所收集资料，《关于成立奇台县 2022 年东湾镇墙户自来水管网改造项目项目部通知》（奇水建管〔2022〕01 号）看出项目是 2022 年 4 月 1 日开工的，综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

(2) 项目完工时间：

根据所收集资料，从项目验收竣工表、项目验收报告中得出项目完工时间为 2022 年 6 月 30 日，综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 12.25 分，得分率 81.67%，具体分析如下：

1. 项目效益



(1) 受益脱贫户


根据单位提交的受益脱贫户名单得出为 8 户，综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2. 保障东湾镇墙户村村民饮水安全率

根据满意度问卷的数据得出满意度为 88.98%，根据评分标准该指标扣除 1.5 分，综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.5 分，得分率 70%。

2. 满意度

根据满意度问卷得出满意度为 90.03%，根据评分标准该指标扣除 1.25 分，综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.75 分，得分率 75%。具体见下图：

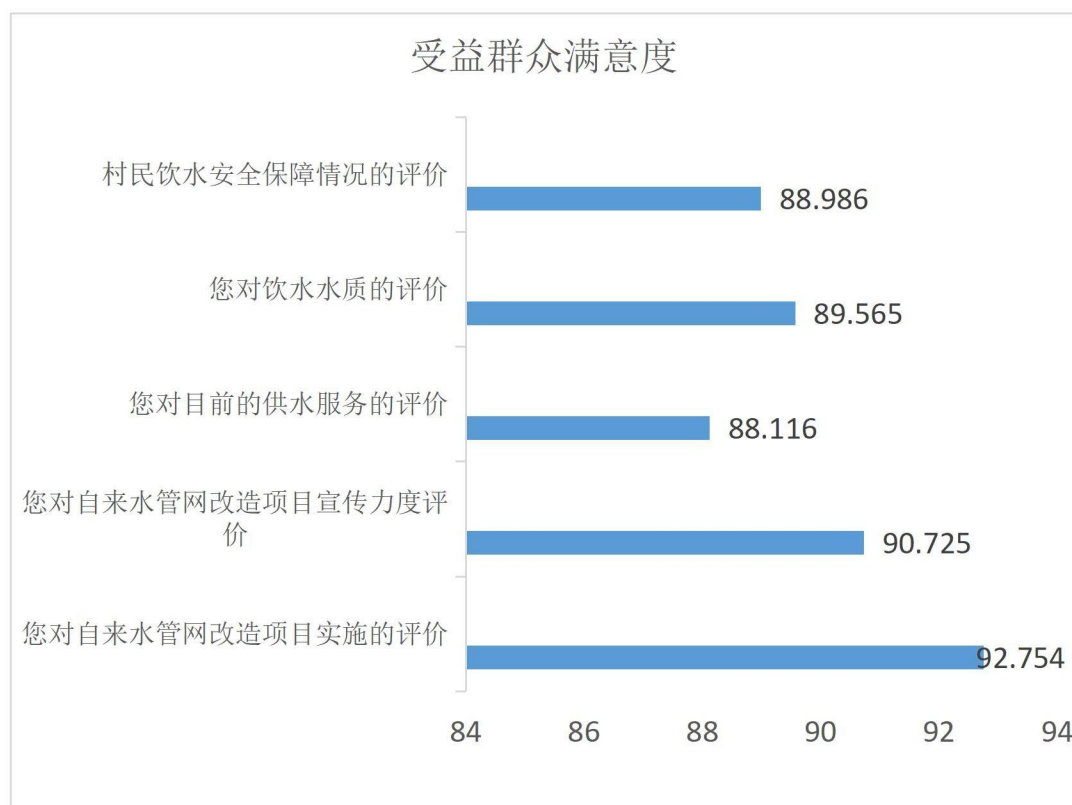



五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.参建单位职责分明，保障项目顺利推进

自来水管网改造工程施工难度大，需要全面掌握老管网的走向及位置，才能保障项目的顺利完成，为此，项目单位加强事前控制，统筹协调各参建单位分工合作，推进项目建设，确保了此项目工程的顺利推进。

2.施工方案合理、降低对居民影响。

工程建设期间，建设单位以此保障居民的用水安全为前提，为减少因施工导致停水情况，采取多方联动方式尽量减少停水频率，并合理的提醒了用水户合理安排好生活用水，缩小对周边村民的生活影响。

（二）存在问题

1.绩效目标不够完整，预算管理有待加强。

绩效目标不够完整，此项目年度绩效目标可实现、可衡量、与总目标相关，有时间限制。但是目标完整性需要有待提高，因为此项目的成本里包含设备采购，数量、质量、时效指标里缺少采购设备的相关指标，指标不完整，预算管理有待加强，对于目标值的填报不是很准确，标杆值与实际完成值偏差大。

2.受益群众满意度有待提升

满意度低于目标值 95%，满意度水平有待提高。根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 90.03%，调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对自己



来水管网改造项目实施的评价（92.75%）、您对自来水管网改造项目宣传力度评价（90.72%）、您对目前的供水服务的评价（88.12%）、您对饮水水质的评价（89.57%）、村民饮水安全保障情况的评价（88.99%）。

3.对村民饮水安全及供水服务保障度不够

通过满意度调查问卷及调研发现村民对供水服务的评价为 88.12%、对村民饮水安全保障情况的评价为 88.99%，可以看出对供水服务及村民饮水安全的保障评价需要有待提高。

4.宣传政策的力度需加强、宣传渠道少。

根据调查和满意度问卷看出在 69 份有效问卷中，被调查对象中选工程宣传牌或项目公示的比例为 37.68%，选看到工程建设队伍的比例为 50.72%，选其他的比例为 11.59%。可以看出宣传政策的力度还需要加强，宣传的渠道单一、没有多渠道的进行宣传，让更多的人了解自来水管网改造项目。

六、相关建议

1.加强目标完整性、加强预算管理

加强绩效目标的合理性，建议增加指标数量指标“设置设备数”质量指标“设备验收合格率”经济效益指标“设备利用率”，使目标更完整，进一步提升预算绩效管理水平。对于目标的填报要进行合理预估，缩小实际值与标杆值的偏差，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从完整性、明确性、合理性、可实现性、相关性、时限性等方面着手，设置与项目匹配的核心指标，每条指标设置都具有相关性，



更好地凸显项目绩效。加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关。

2.提升受益群众满意度、提高群众幸福感

首先，加强与村民之间的沟通，建议通过多种方式收集村民的对自来水管网改造项目的意见和建议，其次，要进行定期对管道设施进行查看，出现问题及时解决，以此来提升村民的满意度，也使项目的实施发挥更大的作用，从而提升群众的幸福感。

3.提升村民用水安全，有效保障供水服务

首先应对设备定期进行巡检维护，并对水质进行定期和不定期的抽检，查看水质是否符合标准。其次加强管理监督措施，并提升服务管理功能，从而保障供水的服务和村民用水安全。

4.加大宣传力度，提高自来水管网改造项目认知度。

首先，加强对自来水管网改造项目宣传，通过多渠道方式进行宣传自来水管网改造项目，提高普及率，其次，拓宽宣传渠道，不止在张贴宣传标识，可以通过村广播、政府网站、抖音等多种方式进行宣传。让村民了解自来水管网改造项目的具体实施政策，从而提高村民对自来水管网改造项目的认知度。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由奇台县水利工程建设管理处提供的资料中提取，并进行线下进行访谈和实地调研工作。针对上述情况，评价组在对本次评价中发现的问题存在局限



性，可能影响本次评价结果，评价组对收集的数据进行分析的基础上，结合相关访谈内容及满意度调查结果对本项目的实施效果进行客观评价。

八、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。

（二）评价结果公开

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，评价结果依法予以公示公开，广泛接受社会监督。



附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (15 分)	A1 项目立项 (5 分)	A101 立项 依据充分性	(3 分)	考察项目立项 的依据文件是 否充分，是否 与国家和地区 的战略目标、 发展计划以及 部门的基本职 能和工作计划 相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金》（新乡村振兴〔2021〕32 号）《关于实施奇台县提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》（奇乡村振兴办〔2021〕1 号）《关于成立奇台县 2022 年东湾镇墙户村自来水管网改造项目项目部通知》（奇水建管〔2022〕1 号）相关文件进行设立；② 本项目与工作计划相匹配；③本项目与奇台县水利工程建设管理处单位职责密切相关，综上，项目立项依据充分，故该指标得 3 分。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	(2 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点：①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。	①项目根据《关于实施奇台县提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》（奇乡振领办〔2021〕1 号）、《关于成立奇齐全得权重分的 100%，奇台县 2022 年东湾镇埒户村自来水管网改造项目项目部通知》（奇水建管〔2022〕1 号）、《东湾镇埒户村自来水管网改造项目实施方案技术审查意见》（奇水技审字〔2021〕1 号）申请设立；②项目所提交的文件、材料符合相关文件要求，③此项目经过绩效评估及集体决策。综上，项目立项程序规范，故该指标得 2 分。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A2 绩效目标（5分）	A201 绩效目标合理性	（2分）	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分（两项各占 10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	①本项目设立了总目标和年度目标，先得 20%权重分；②年度绩效目标可实现、可衡量、与总目标相关，有时间限制。但是目标完整性需要有待提高，因为此项目的成本里包含设备采购，数量、质量、时效指标里缺少采购设备的相关指标，指标不完整。该指标扣除 $80\% \times 3/6 \times 2 = 0.8$ ，综上所述该指标得 1.2 分	1.2	60%
		A202 绩效指标明确性	（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，不满足得零分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，1 项不满足扣除 20%的比例，清晰和可衡量性都不满足得零分；	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分。②指标清晰、可衡量性。③项目目的指标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分。故该绩效指标的明确性得 3 分。综上所述该指标得 3 分。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，不满足得零分。			
	A3 资金投入 (5 分)	A301 预算编制科学性	(3 分)	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上，此项得 3 分。	3	100%
		A302 资金分配合理性	(2 分)	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①预算资金分配依据充分，有相应明细表；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上两项各得 50%的权重分，综上，此项得 2 分。	2	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (10 分)	B101 资金到位率	(2 分)	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预	100%	通用标准	资金到位率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	此项资金到位率为 500 万元，到位率为 100%。综上，此项得 2 分。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				算批复金额 ×100%						
		B102 预算 执行率	(3 分)	反映项目预算 资金的实际执 行情况；预算 执行率=实际 支出金额/预 算批复金额 ×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得 满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完 为止。	该项目预算金额为 500 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际 支出 500 万元，预算 执行为 500/500*100%=100% ，综上，该指标得分 为 3 分。	3	100%
		B103 资金 使用合规性	(5 分)	反映项目资金 使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不 合格得零分。	①本项目资金的使用 符合国家财经法规和 财务管理制度以及有 关资金管理规定的规 定；②预算分配、拨 付均有完整的审批程 序和手续；③项目支 出符合项目预算批复 或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情 况。综上，该项得 5	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								分。		
	B2 组织实施（10分）	B201 管理制度健全性	（5分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①制定《奇台县水利工程建设管理处项目资金财务管理制度》；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上，该项得 5 分。	5	100%
		B202 制度执行有效性	（5分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③学生提供的资料和评定的依据等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上两项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①项目按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金》（乡村振兴〔2021〕32号）《奇台县水利工程建设管理处项目资金财务管理制度》相关法律法规和相关管理规定；②因为此项目没有项目调整及支出调整故项目调整及支出调整手续不涉及。③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上，该项得 5 分。		
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (20 分)	C101 自来水管网改造长度	(10 分)	考察奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造长度	$\geq 32.89\text{km}$	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造长度，达到预期值得满分，低于预期值的 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据所收集资料，从项目验收竣工表中得出东湾镇墙户村自来水管网改造长度 32.30km，根据评分标准扣除 0.9 分，综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 9.1 分，得分率 91%。该指标得 9.1 分	9.1	91%
		C102 吊装钢筋混凝土预制井数量	(10 分)	考察奇台县东湾镇墙户村吊装钢筋混凝土预制井数量	≥ 98 座	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县东湾镇墙户村吊装钢筋混凝土预制井数量，达到预期值得满分，低于预期值的 1%扣除 5%的权重分，扣完为止	根据所收集资料，从项目验收竣工表中得出东湾镇墙户村吊装钢筋混凝土预制井数量为 46 座，根据评分标准扣除 2.65 分，综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 7.35 分，得分率 73.5%，	7.35	73.47%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	C2 产出质量 (10 分)	C201 工程 验收合格率	(10 分)	考察奇台县东 湾镇墒户自来 水管网改造工 程项目工程验 收合格率	=100%	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县东湾镇墒户自来水管网改造工程项目验收合格率情况，达到预期值得满分，低于预期值的1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据所收集资料，从项目验收竣工表中得出工程验收合格率达到 100%，根据评分标准，该指标得 10 分	10	100%
	C3 产出时效 (20 分)	C301 项目 开工时间	(10 分)	考察奇台县东 湾镇墒户自来 水管网改造工 程项目开工时 间	=2022 年 4 月	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县东湾镇墒户自来水管网改造工程项目开工时间，达到预期值得满分，低于预期值扣除全部分值。	根据所收集资料，《关于成立奇台县 2022 年东湾镇墒户自来水管网改造项目项目部分通知》（奇水建管〔2022〕01 号）看出项目是 2022 年 4 月 1 日开工的，根据评分标准，该指标得 10 分	10	100%
		C302 项目 完工时间	(10 分)	考察奇台县东 湾镇墒户自来 水管网改造工 程项目完工时 间	2022 年 6 月	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县东湾镇墒户自来水管网改造工程项目完工时间，达到预期值得满分，低于预期值扣除全部分值。	根据所收集资料，从项目验收竣工表、项目验收报告中得出项目完工时间为 2022 年 6 月 30 日，根据评分标准，该指标得 10 分	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
D 项目效益 (15)	D1 项目效益 (10 分)	D101 受益 脱贫户	(5 分)	考察奇台县东湾镇墒户自来水管网改造工程项目受益贫困户数量情况	≥8 户	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县东湾镇墒户自来水管网改造工程项目受益脱贫户数量，达到预期值得满分，低于预期值的 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据单位提交的受益脱贫户名单得出为 8 户，根据评分标准得分为 5 分	5	100%
		D102 保障 东湾镇墒户 村村民饮水 安全率	(5 分)	考察奇台县东湾镇墒户自来水管网改造工程保障东湾镇墒户村村民饮水安全率情况	≥95%	计划标准	根据单位提供资料，考察奇台县东湾镇墒户自来水管网改造工程保障东湾镇墒户村村民饮水安全率情况，达到预期值得满分，低于预期值的 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据满意度问卷的数据得出满意度为 88.98%，根据评分标准该指标扣除 1.5 分权重，故得分 3.50 分。	3.50	70%
	D2 满意度 (5 分)	D201 受益 群众满意度	(5 分)	考察受益群众满意度	≥95%	计划标准	受益群众满意度达到目标值得满分，每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	根据满意度问卷得出满意度为 90.03%，根据评分标准该指标扣除 1.25 分，故得分 3.75 分。	3.75	75%
总分			100						92.9	92.90%



附件 2 基础表

项目绩效评价资料目录				
奇台县东湾镇户村自来水管网改造项目				
序号	资料名称	备注	资料是否提交	资料未提交原因
政策制度性文件				
1	国家相关法律、法规和规章制度；	必须取得		
2	相关行业发展规划和方针政策；		是	
3	相关行业标准及专业技术规范；		是	
4	相关管理制度；	必须取得	是	
业务资料				
5	绩效目标申报表及绩效监控表；	必须提供	是	
6	项目单位工作职责、中长期发展规划及年度工作计划；	必须提供	是	
7	项目立项依据和背景资料（包括相关文件及上级批示等）	必须提供	是	
8	项目申报书、可行性报告及专家论证意见；	必须提供	是	
9	项目批复、总体实施方案及年度工作计划；	必须提供	是	
10	项目招标采购工作及采购协议；		是	
11	项目年度工作总结；	必须提供	是	
12	项目有关管理办法和文件；	必须提供	是	
13	项目调整情况及其报告和批准文件；		否	无调整
14	项目验收（或中期检查、评估）报告；		是	
15	项目绩效情况说明及项目单位撰写的项目绩效报告及绩效自评报告；	必须提供	是	
16	反映项目实施成效的其他资料，如：进展情况汇报、监理报告、会议纪要、评审鉴定文件等；		是	
财务资料				
17	项目预算安排情况（如为延续项目，应提供以前年度预算情况）	必须取得	是	
18	项目预算批复文件、资金下达文件、资金到位凭证、预算调整文件	必须取得	是	
19	项目支出财务明细账、凭证及资金执行情况统计表；	必须取得	是	
20	项目相关协议合同及台账；	必须取得	是	
21	项目年度决算报告及年度审计报告；	必须取得	是	
22	项目资金管理办法、单位财务管理制度；	必须取得	是	
23	反映项目经费收支和财务管理的其他资料；		否	无



附件 3 工作量明细表

奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目完成工作量明细

序号	工作任务	完成数量	说明
1	自来水管网改造长度	32.3km	
2	吊装钢筋混凝土预制井数量	46座	
3	工程验收合格率	100%	
4	项目开工时间	2022年4月1日	
5	项目完工时间	2022年6月30日	
6	工程使用年限	30年	
7	受益群众户数	920户	
8	受益人数	3279人	
9	受益脱贫户	8户	
10	保障东湾镇墙户村村民饮水安全	≥95%	
填表单位（公章）  填写人：李永亮 联系电话：18638815117 填写日期：			



附件 4 问卷调查报告

东湾镇墙户村自来水管网改造项目受益群众

满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的业务经费覆盖群体，为东湾镇墙户村自来水管网改造项目受益群众，针对项目调查人群评价组设计的调查问卷进行调查。

（二）调研内容

1.单选题：

- 1) 您的性别是
- 2) 你的身份是
- 3) 您是否在本村长期居住？
- 4) 您对目前的自来水管道是否满意？
- 5) 您家的饮水水质多久进行检测？
- 6) 您对奇台县自来水管网改造项目了解程度
- 7) 您是通过哪种方式了解奇台县 2022 年自来水管网改造？
- 8) 您觉得该项目实施后生活饮用水供应充足吗？

2.多选题：

3.满意度问题：

- 1) 您对自来水管网改造项目实施的评价
- 2) 您对自来水管网改造项目宣传力度评价



- 3) 您对目前的供水服务的评价
- 4) 您对饮水水质的评价
- 5) 村民饮水安全保障情况的评价
- 6) 您对学校资助评审工作的评价

二、调研方法与抽样方式

(一) 调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二) 抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷调查收回有效问卷共69份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。



通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次东湾镇墙户村自来水管网改造项目受益群众满意度问卷的信度为0.92。

2. 效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。



调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表 1 东湾镇墙户村自来水管网改造项目受益群众满意度问卷效度汇总


题目	效度得分
您对目前的供水服务的评价	0.89
村民饮水安全保障情况的评价	0.87
您对自来水管网改造项目宣传力度评价	0.87
您对饮水水质的评价	0.93
您对自来水管网改造项目实施的评价	0.81

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别是

在69份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为75.36%，选女的比例为24.64%。




2) 你的身份是

在69份有效问卷中，被调查对象中选村干部 的比例为13.04%，选普通村民的比例为69.57%，选其他的比例为17.39%。




3) 您是否在本村长期居住?

在69份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为85.51%，选否的比例为14.49%。



4) 您对目前的自来水管道的满意?

在69份有效问卷中，被调查对象中选满意的比例为95.65%，选不满意的比例为4.35%。

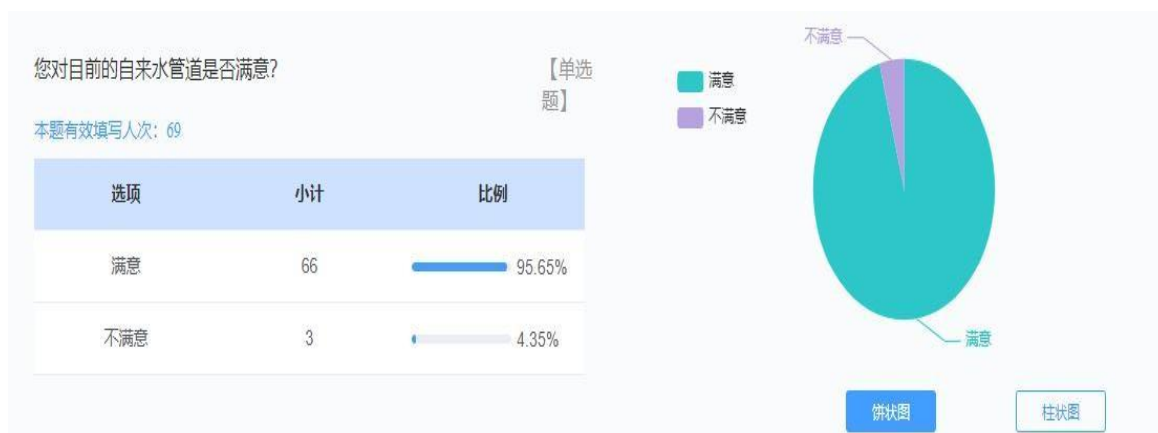




5) 您家的饮水水质多久进行检测?

在69份有效问卷中,被调查对象中选水质检查每年进行一次的比例为47.83%,选水质检查多年进行一次的比例为2.9%,选水质出现问题才检查的比例为0%,选不清楚是否检查的比例为49.28%。

本题有效填写人次: 69

选项	小计	比例
水质检查每年进行一次	33	47.83%
水质检查多年进行一次	2	2.9%
水质出现问题才检查	0	0%
不清楚是否检查	34	49.28%



6) 您对奇台县自来水管网改造项目了解程度


在69份有效问卷中,被调查对象中选了解的 的比例为24.64%,选有点了解的比例为59.42%,选不了解的比例为15.94%。

您对奇台县自来水管网改造项目了解程度

【单选题】

本题有效填写人次: 69


选项	小计	比例
了解	17	24.64%
有点了解	41	59.42%
不了解	11	15.94%






7) 您是通过哪种方式了解奇台县2022年自来水管网改造?

在69份有效问卷中,被调查对象中选工程宣传牌或项目公示 的比例为37.68%,选看到工程建设队伍 的比例为50.72%,选其他的比例为11.59%。

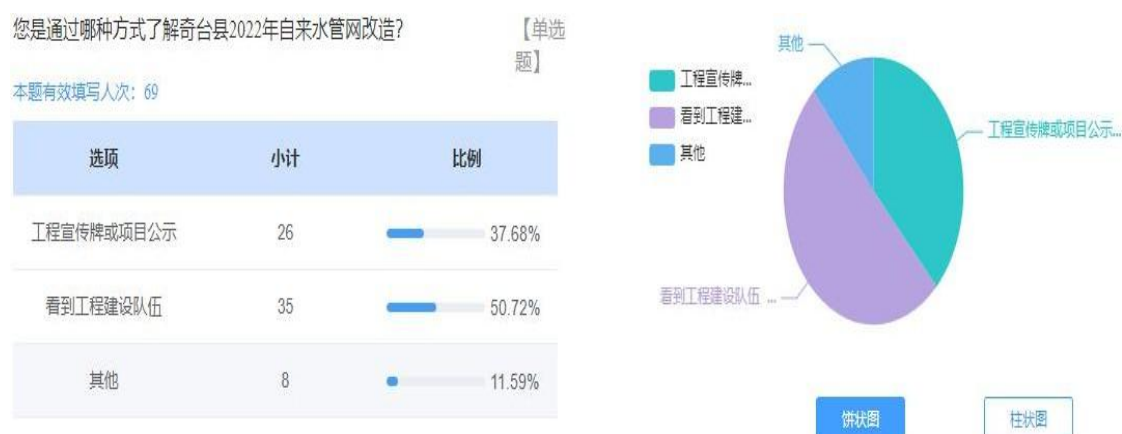

8) 您觉得该项目实施后生活饮用水供应充足吗?


在69份有效问卷中,被调查对象中选满足饮水需要 的比例为88.41%,选勉强满足饮水需要的比例为8.7%,选不能满足饮水需要的比例为2.9%。

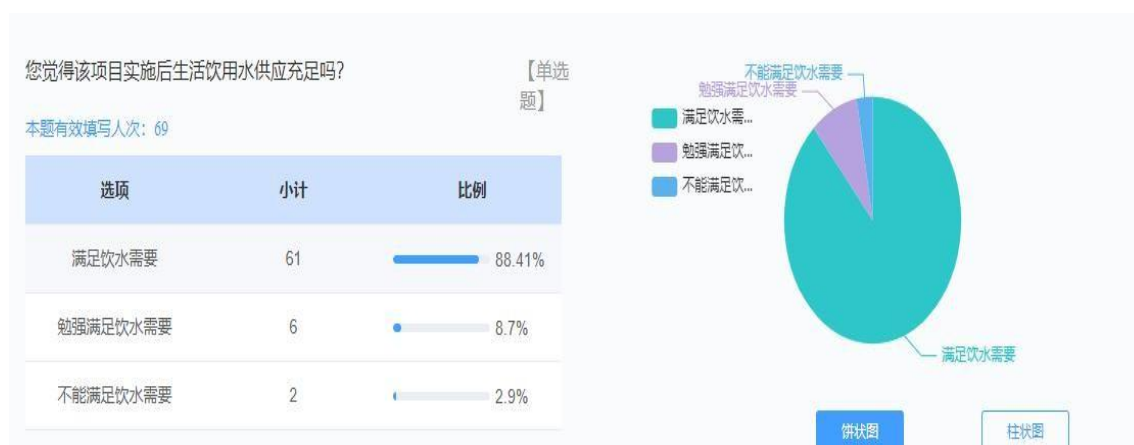



2. 满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为90.03%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对自来水管网改造项目实施的评价（92.75%）、您对自来水管网改造项目宣传力度评价（90.72%）、您对目前的供水服务的评价（88.12%）、您对饮水水质的评价（89.57%）、村民饮水安全保障情况的评价（88.99%）。具体如下图所示。

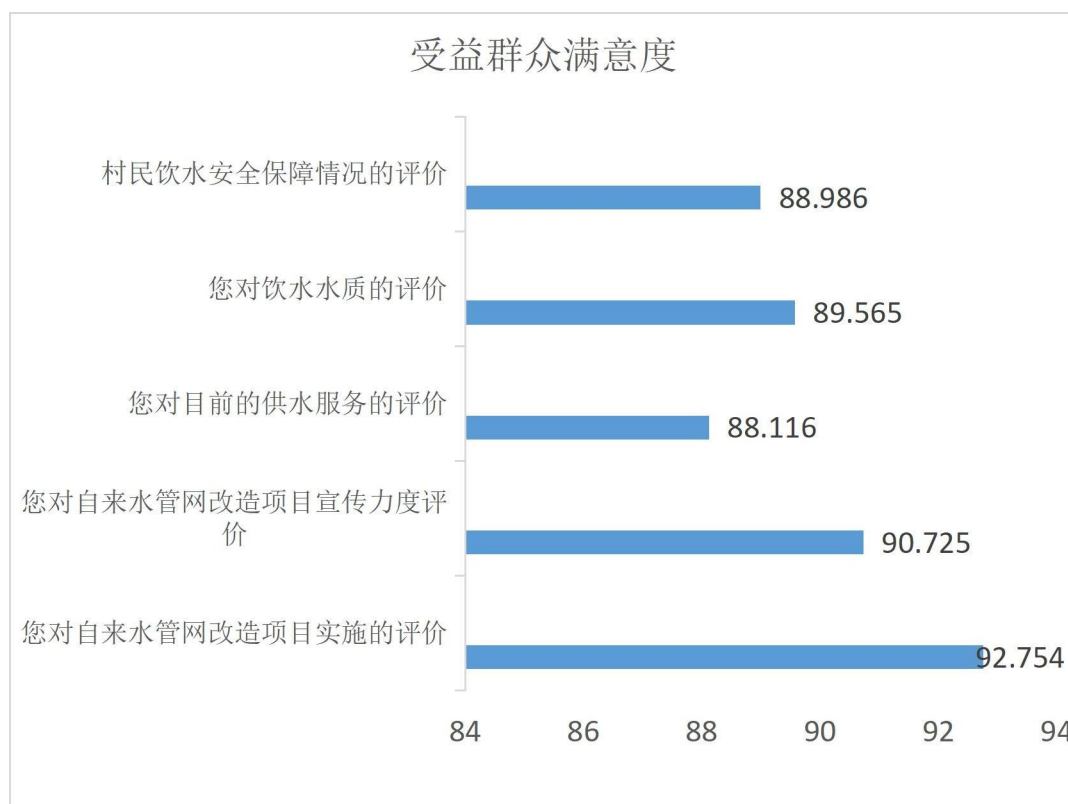



附件 5 受益群众满意度问卷

东湾镇墙户村自来水管网改造项目受益群众满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受奇台县财政局的委托，我公司对东湾镇墙户村自来水管网改造项目的受益群众展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2023 年 7 月

一、基本信息题

1. 您的性别（ ）

A.男 B. 女

2. 你的身份是

A.村干部 B.普通村民 C.其他

二、基本问题（不定项选择题）

1. 您是否在本村长期居住？

A.是 B.否

2. 您对目前的自来水管道是否满意？

A.满意 B.不满意

3. 您家的饮水水质多久进行检测？

A.水质检查每年进行一次 B.水质检查多年进行

一次

C.水质出现问题才检查 D.不清楚是否检查



4.您对奇台县自来水管网改造项目了解程度

A.了解 B.有点了解 C.不了解

5.您是通过哪种方式了解奇台县 2022 年自来水管网改造?

A.工程宣传牌或项目公示

B.看到工程建设队伍

C.其他

6.您觉得该项目实施后生活饮用水供应充足吗?

A.满足饮水需要 B.勉强满足饮水需要 C.不能满足饮水需要

三、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，

其中，5 分最高，1 分最低。

满意度问题	最高 —————→ 最低				
1.您对自来水管网改造项目实施的评价	5	4	3	2	1
2.您对自来水管网改造项目宣传力度评价	5	4	3	2	1
3.您对目前的供水服务的评价	5	4	3	2	1
4.您对饮水水质的评价	5	4	3	2	1

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：

四、对当前自来水管网改造项目有何改进的建议？



附件 6 相关负责人访谈

东湾镇墙户村自来水管网改造项目相关负责人访谈提纲

- 1.请您简要介绍你们项目的实施流程
- 2.请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。
- 3.请您简要介绍该经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
- 4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
- 5.该项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？
- 6.通过该项经费，您认为是否达到了其预期效果？
- 7.请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。
- 8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
东湾镇墙户村自来水管网改造项目负责人	高小亮	1868955617	



东湾镇墙户村自来水管网改造项目相关负责人访谈提纲

- 1.请您简要介绍你们项目的实施流程
- 2.请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。
- 3.请您简要介绍该经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
- 4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
- 5.该项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？
- 6.通过该项经费，您认为是否达到了其预期效果？
- 7.请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。
- 8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
东湾镇墙户村自来水管网改造项目负责人	梁彦斌	13899612777	



附件 7 资料照片

国库集中支付凭证

652325

第 DP2022042500068 号

资金性质：一般公共预算资金

20220425

单位：元

付款人	全 称	奇台县财政局	收款人	全 称	新疆绿赛节水科技开发有限公司
	账 号	3004862029200019320		账 号	8351010001201100032352
	开户银行	工行奇台县支行		开户银行	新疆博乐市农村商业银行股份有限公司
支付金额	人民币 (大写):	陆拾叁万捌仟零捌拾柒元肆角陆分			金额 (小写)
					¥ 638,087.4
单 位	奇台县水利工程建设管理处		主管部门	奇台县水利工程建设管理处	
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		支付申请编号	AP20220424184616973	
结算方式	其他		用 途	新疆绿赛管材款	
  			银行	实际支付金额：¥ 638,087.46	
			会计	(借)	
			复核员：		
			分录		

国库集中支付凭证

652325

第 DP2022061500116 号

资金性质：一般公共预算资金

20220615

单位：元

付款人	全 称	奇台县财政局	收款人	全 称	新疆绿赛节水科技开发有限公司
	账 号	3004862029200019320		账 号	8351010001201100032352
	开户银行	工行奇台县支行		开户银行	新疆博乐市农村商业银行股份有限公司
支付金额	人民币 (大写):	壹拾肆万贰仟伍佰元整			金额 (小写)
					¥ 142,500.0
单 位	奇台县水利工程建设管理处		主管部门	奇台县水利工程建设管理处	
功能分类科目	2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		支付申请编号	AP20220615135349063	
结算方式	其他		用 途	管材费	
  			银行	实际支付金额：¥ 142,500.00	
			会计	(借)	
			复核员：		
			分录		



新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司

审核报告书

新鸿工价字(2022)CJ-042号

建设单位：奇台县水利工程建设管理处

项目名称：奇台县东湾镇墙户村自来水管网改造项目施工标段



新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司

新鸿工价字[2022]CJ-042号

工程审核报告书

受奇台县水利工程建设管理处的委托，新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司派出审核组，对奇台县东湾镇填户村自来水管网改造项目施工标段进行竣工结算审核，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。奇台县水利工程建设管理处及有关单位对其提供的与审核有关的工程、电子数据及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司责任是对奇台县水利工程建设管理处提供的与审核相关的工程资料及其他相关材料的审核结果负责。

一、基本情况：

奇台县东湾镇填户村自来水管网改造项目施工标段的建设单位为奇台县水利工程建设管理处，施工单位为新疆三友建设工程有限公司。建设地址为奇台县东湾镇。

该项目经中共奇台县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室、奇台县财政局文件，奇乡振领办[2021]1号文件《关于实施奇台县提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》进行立项。该项目委托新疆新水建设工程造价咨询有限责



新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司

新鸿工价字[2022]CJ-042号

工程审核报告书

受奇台县水利工程建设管理处的委托，新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司派出审核组，对奇台县东湾镇埽户村自来水管网改造项目施工标段进行竣工结算审核，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。奇台县水利工程建设管理处及有关单位对其提供的与审核有关的工程、电子数据及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司责任是对奇台县水利工程建设管理处提供的与审核相关的工程资料及其他相关材料的审核结果负责。

一、基本情况：

奇台县东湾镇埽户村自来水管网改造项目施工标段的建设单位为奇台县水利工程建设管理处，施工单位为新疆三友工程建设有限公司。建设地址为奇台县东湾镇。

该项目经中共奇台县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室、奇台县财政局文件，奇乡振领办[2021]1号文件《关于实施奇台县提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》进行立项。该项目委托新疆新水建设工程造价咨询有限责



文件及施工过程中形成的工程技术资料；

2、昌吉地区相关调差文件；

3、自治区、昌吉州及各县相关工程结算规定；

四、实施审核的情况：

此次审核，我们主要采取了现场测量、依据相关资料、利用计算机软件对工程量进行全面计算核对等方式，对工程竣工结算进行了审核，最终形成审核结果。具体审核情况如下：

施工单位上报奇台县东湾镇塘户村自来水管网改造项目施工标段竣工结算 2613669.1 元，经审核，核定工程竣工结算 2441138.85（大写：贰佰肆拾肆万壹仟壹佰叁拾捌元捌角伍分），核减额 172530.25 元。

建设单位、施工单位应依据施工合同约定据实结算。

五、审核人员：

审核人：马瑞宏

复核人：郭永天

项目组成员：

新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司

2022 年 7 月 9 日



建设工程造价咨询审核定案书

工程名称: 奇台县东湾镇填户村自来水管网改造项目施工标段		工程地址: 奇台县
建设单位: 奇台县水利工程建设管理处		送审造价: 2613669.1 元
供货单位: 新疆三友工程建设有限公司		审定造价: 2441138.85 元
工程规模:	施工工期: 2022 年 4 月-2022 年 6 月	核减值: 172530.25 元
审定金额大写: 贰佰肆拾肆万壹仟壹佰叁拾捌元捌角伍分		
建设单位(盖章): 法人代表: 负责人: 李海斌 2022 年 7 月 7 日	施工单位(盖章): 法人代表: 魏孙印 负责人: 赵智利 2022 年 7 月 8 日	咨询单位(盖章): 法人代表: 张雪 负责人: 王译名 2022 年 7 月 8 日







